



CONSEQUENCES DE LA CRISE ACTUELLE SUR LA COMMANDE PUBLIQUE : ENQUETE AUPRES DES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS EN BFC

Version provisoire

+

SOMMAIRE

1. **Cadrage de l'enquête et méthodologie**
2. **Etat des lieux des projets des maîtres d'ouvrage ayant répondu à l'enquête**
3. **Nature des travaux**
4. **Difficultés rencontrées dans l'exécution des projets**
5. **Raisons et ampleur du retard dans la réalisation des travaux (Chantiers en cours ou terminés)**
6. **Propositions d'adaptations sur les projets en cours et à venir**
7. **Evaluation de l'augmentation des prix de l'énergie et des matériaux**
8. **Impact de la crise actuelle sur l'avancement des projets et la passation des marchés**
9. **Adaptations à apporter à la commande publique**

Version provisoire

1.

+ CADRAGE DE L'ENQUETE ET METHODOLOGIE



La Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté a commandé une enquête à la Cellule Economique Régionale de la Construction CERC BFC pour mener une **enquête auprès des maîtres d'ouvrage publics** dont l'objectif est de connaître l'ampleur des effets de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie sur l'exécution des contrats de la commande publique, ainsi que les mesures prises pour pallier les difficultés rencontrées. L'enquête a porté sur les projets de Bâtiment et de Travaux Publics de l'année 2022.



La CERC BFC remercie tous les maîtres d'ouvrage publics qui ont bien voulu consacrer du temps à cette **enquête**. Leurs réponses nous permettent d'abord de mieux connaître les problèmes auxquels ils sont confrontés, ensuite de comprendre l'impact de la crise de l'énergie et de la flambée des prix des matériaux sur leurs projets et enfin d'apprécier les solutions apportées.



Ce sont près plus de 3 000 maîtres d'ouvrages qui ont été contactés depuis le 4 juillet 2022 et qui **sont relancés chaque quinzaine**. Pour la présente enquête, ont été contactés les collectivités (communes, EPCI, départements) les bailleurs sociaux et l'Etat, ainsi que les opérateurs et services de l'Etat. La **réalisation de ce travail repose sur les informations recueillies auprès de ces derniers et traitées anonymement**. A date, ce sont **39 maîtres d'ouvrage publics** qui ont répondu partiellement ou en totalité à l'enquête, soit (1,3 % des enquêtés).

INTRODUCTION

La circulaire du premier ministre n° 6338-SG du 30 mars 2022 sensibilise les collectivités locales et les établissements publics aux règles relatives à l'exécution des contrats de la commande publique en conséquence du contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières.

L'augmentation sans précédent des prix de certaines matières premières, ainsi que la volatilité des coûts de l'énergie constituent une circonstance exceptionnelle, de nature à affecter gravement, dans plusieurs secteurs d'activité, les conditions d'exécution des contrats, voire leur équilibre économique, et à mettre en danger la pérennité de nombreuses entreprises ainsi que l'emploi de leurs salariés.

La présente enquête a pour objectif d'analyser les conséquences de la situation actuelle sur les marchés publics, les projets des acteurs publics, puis sur la filière du BTP en région. Elle concerne des appels à projets, bons de commandes, marchés publics, ... dans le secteur des Travaux Publics et du Bâtiment. Les données auront pour objet d'alimenter l'observation des effets de la crise actuelle sur les filières du Bâtiment en Bourgogne Franche-Comté.

Les données sont collectées à titre confidentiel et seront exploitées de manière agrégée en respectant l'anonymisation dans la publication des résultats.

Version provisoire

2.

+ ETAT DES LIEUX DES PROJETS DES MAITRES D'OUVRAGE AYANT REPONDU A L'ENQUETE

39
MOA




52
projets



4 M€

Répartition par type de MOA

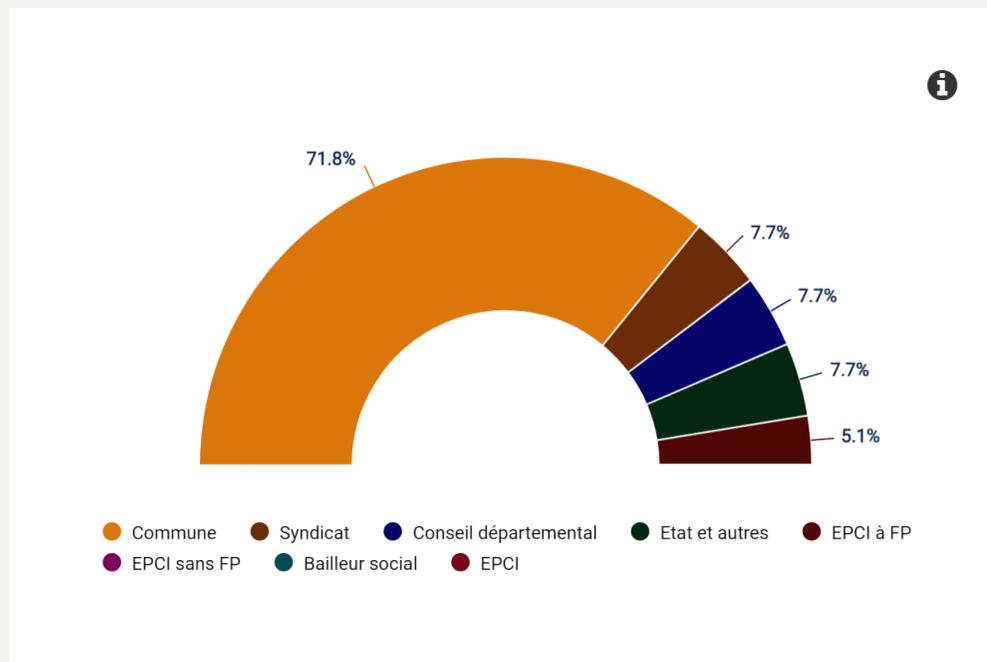

Unité : % des MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC

Répartition des MOA par département



Unité : nombre de MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC

Répartition des projets par département

En nombre de projets



Unité : nombre de projets renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC

En montant (en million d'€)



Unité : somme en million des montant des travaux des MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC

Version provisoire


3. + NATURE DES TRAVAUX

Bâtiment

Combien de chantiers votre structure gère-t-elle en 2022 (en nombre et en montant de projets) ?




En nombre de projets

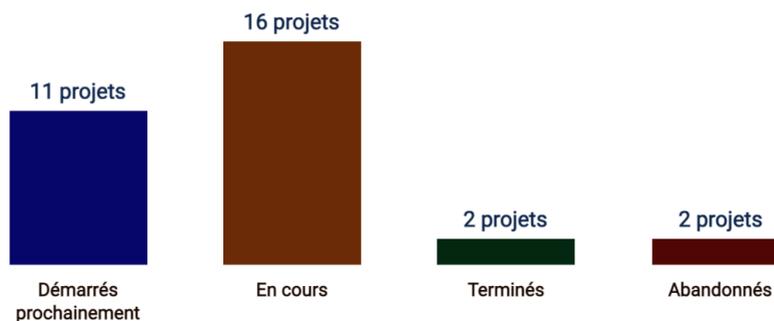

Unité : nombre de chantiers engagés en 2022 par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC

En montant de travaux

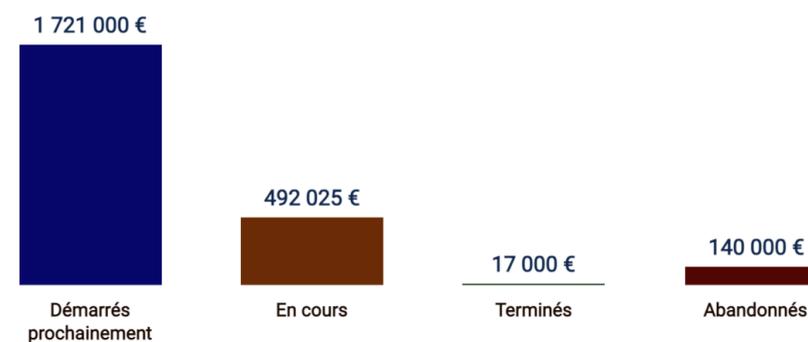


Unité : montant total des travaux engagés en 2022 par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC

31 projets dans le secteur du Bâtiment, représentant 2,4 M€ pour 2022.

Travaux Publics




En nombre de projets

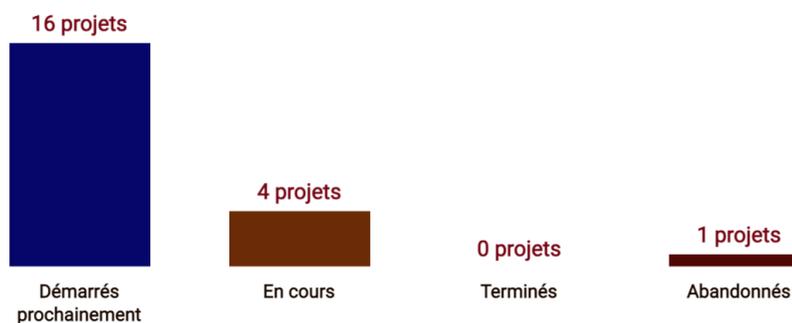

Unité : nombre de chantiers engagés en 2022 par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC

En montant de travaux

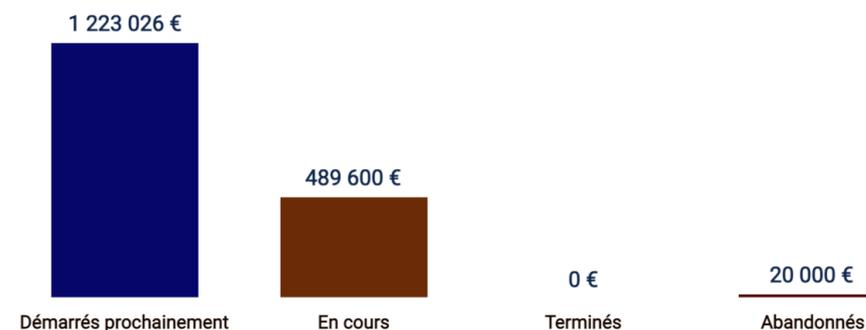

Unité : montant total des travaux engagés en 2022 par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC



21 projets de Travaux Publics, représentant 1,7 M€ pour 2022.

Version provisoire

4.

+ DIFFICULTES RENCONTREES DANS L'EXECUTION DES PROJETS

20 projets sont soit confrontés à une hausse de délais, soit à l'arrêt.

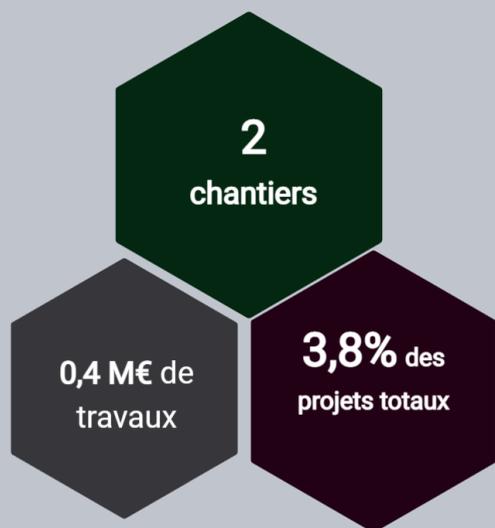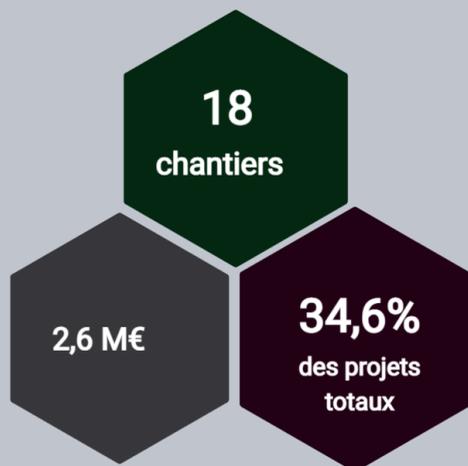

Unité: En % des 52 projets déclarés par les MOA répondants au 26 août 2022

Combien de vos chantiers sont touchés par la hausse de délais ?

En nombre de projets



Unité : nombre de projets renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC

En montant de projets (en €)



Unité : montant total des travaux renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC


Combien de chantiers sont à l'arrêt ?

En nombre de projets



Unité : nombre de projets renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC

En montant de projets (en €)

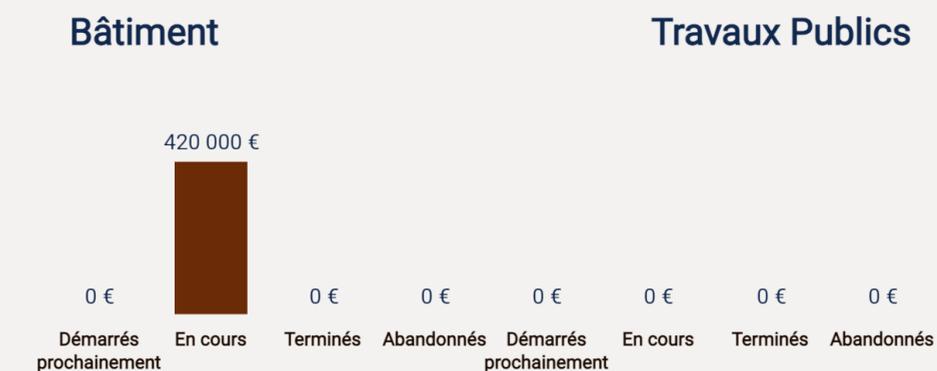

Unité : montant total des travaux renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC

Version provisoire

5.

RAISONS ET AMPLEUR DU RETARD DANS LA REALISATION DES TRAVAUX (CHANTIERS EN COURS OU TERMINES)

Concernés les projets en cours et / ou terminés, avez-vous du retard dans l'exécution des travaux par rapport au calendrier initial ?

Selon les répondants, 2 chantiers en cours ou terminés, accusent du retard pour diverses raisons.

1 projets dans le Bâtiment

3,2 % des projets totaux

Unité : % des 31 projets de Bâtiment renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC au 26 août 2022

1 chantiers de Travaux Publics

4,8% des projets totaux

Unité : % des 21 projets de TP renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC au 26 août 2022

1. Raisons évoquées



Unité : % des MOA évoquant les raisons - Source : Enquête CERC BFC

Autres raisons

Rechercher...

Nouveau texte

2. Ampleur du retard




Version provisoire

6. PROPOSITIONS D'ADAPTATIONS SUR LES PROJETS EN COURS ET A VENIR

Réalisation conforme / adaptations envisagées

La réalisation finale du projet est-elle conforme au projet initial ?



Adaptations envisagées en nombre de projets



Adaptation envisagées pour les projets en cours

Bâtiment

Travaux Publics



Rechercher...

0 0 0 0 0 0 0 0

Utilisation d'autres matériaux Modification des plans et des cotes Négociation sur les prix Négociation sur l'approvisionnement en matériaux Utilisation d'autres matériaux Modification des plans et des cotes Négociation sur les prix Négociation sur l'approvisionnement en matériaux

Unité : nombre de projets des MOA - Source : Enquête CERC BFC

Adaptations envisagées pour les futurs projets

Dans le secteur du Bâtiment

Dans le secteur des Travaux Publics

Rechercher...

Rechercher...

planning
envergure
hausse des prix
réhabilitation neant
budget
prévisionnel
délai d'approvisionnement
plan
abandon
couts
retard
important
néant
sujet
projection

“ non concerné car pas de travaux pour le moment ”
“ rien ”
“ Pas de retard ”
“ A envergure constante du projet, réactualiser les projections financières / les budgets ”


supplémentaire
objet secteur
seul décision
délai année devis
augmentation refecton
retard minimum
subvention

“ non concerné car pas de travaux pour le moment ”
“ rien ”
“ Un retard lié à l'augmentation donc demande de subvention supplémentaire ”
“ sans objet ”

Version provisoire 7.

+ EVALUATION DE L'AUGMENTATION DES PRIX DE L'ENERGIE ET DES MATERIAUX

Vos chantiers sont-ils impactés par la hausse des prix de l'énergie ?

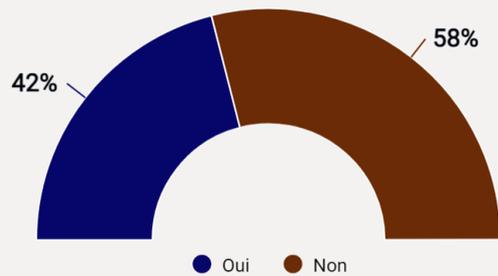


Une **i** augmentation moyenne de **10 %**.



En nombre de projets

Bâtiment

Travaux Publics

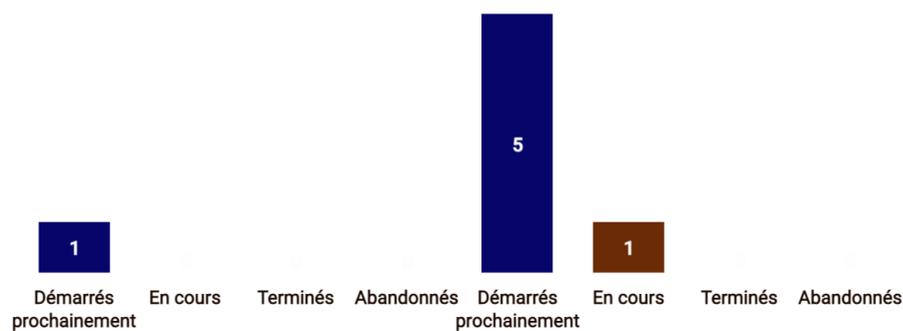


Unité : nombre de projets subissant une hausse des prix de l'énergie renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC



En montant de projets (en €)


Bâtiment

Travaux Publics

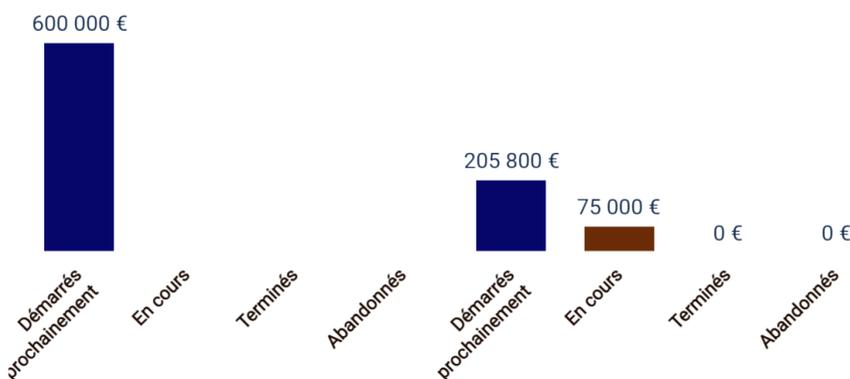

Unité : nombre de projets subissant une hausse des prix des matériaux renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC

Vos chantiers sont-ils impactés par la hausse des prix des matériaux ?

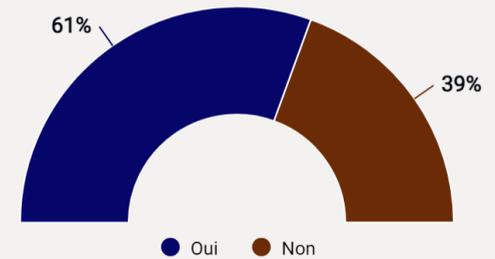


Une **i** augmentation moyenne de **11,1 %**.

En nombre de projets

Bâtiment

Travaux publics

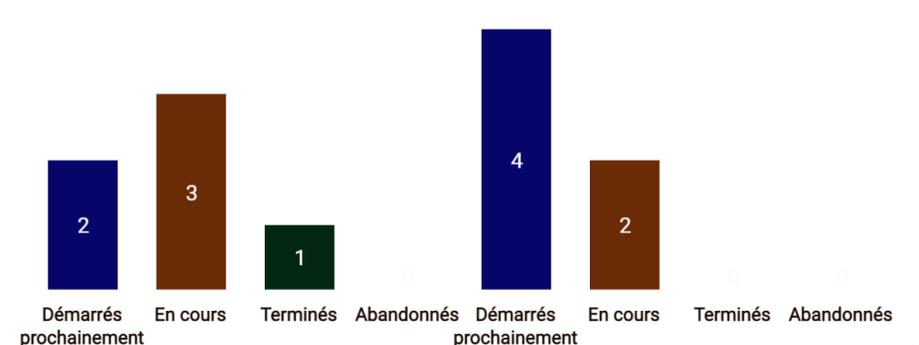


Unité : en montant de projets subissant une hausse des prix de l'énergie renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC

En montant de projets (en €)

Bâtiment

Travaux Publics

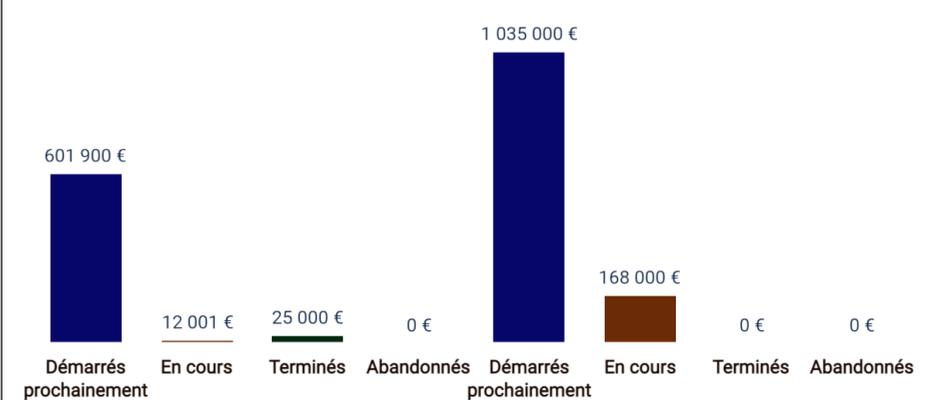

Unité : en montant de projets subissant une hausse des prix des matériaux renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête - Source : Enquête CERC BFC

7 projets

impactés par une hausse des prix de l'énergie

1,8 M€ de travaux

13,5% des projets totaux

12 projets

subissent une hausse de prix des matériaux

1,8 M€

23,1% des projets globaux

Unité : En % des 52 projets déclarés par les MOA répondants au 26 août 2022

Version provisoire

8.

+ IMPACTS DE LA CRISE ACTUELLE SUR L'AVANCEMENT DES PROJETS ET LA PASSATION DES MARCHES

Avez-vous des chantiers à l'arrêt ou dont le planning est fortement perturbé ?




0 projets de Bâtiment

Unité : nombre de projets renseignés par les MOA ayant répondu à cette question - Source : Enquête CERC BFC



2 projets de Travaux Publics

Unité : nombre de projets renseignés par les MOA ayant répondu à cette question - Source : Enquête CERC BFC



Avez-vous eu des lots infructueux ?

● Oui ● Non

Bâtiment

Rechercher...

“ Pas concerné ”
“ Marché de maintenance bâtiment lot plomberie sanitaire, pas de candidature ”


candidature
marché

Travaux Publics

Rechercher...

“ pas de réponse à des marché d'acquisition de véhicules ”
“ Pas de marché ”

pas de réponses
marché

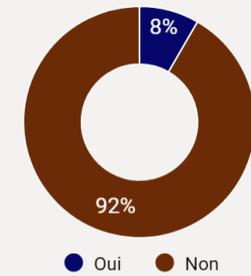

Avez-vous eu des marchés infructueux ?

● Oui ● Non

Bâtiment

Rechercher...

“ pas concerné ”

Travaux Publics

Rechercher...


“ pas de réponse à des marché d'acquisition de véhicules ”

acquisition
marché

Version provisoire

9. ADAPTATIONS A APPORTER A LA COMMANDE PUBLIQUE

Envisagez-vous une révision des prix des marchés en cours ?

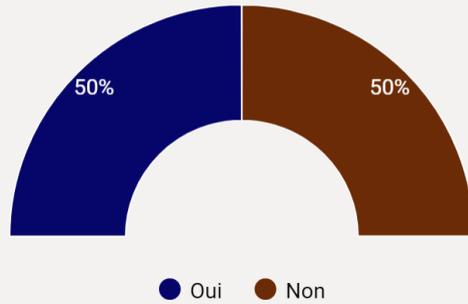

Si oui, expliquez

Rechercher...

hausse

hausse du carburant sur les marchés de collecte des déchets

budget à revoir

Renchérissement des prix de l'acier, du bois, etc.

les fournisseurs envoient des courriers concernant la hausse des tarifs en fonction des matières premières ou frais de transport qui explosent

Comment allez-vous procéder ?

Rechercher...

convention au titre de l'impévision


budget à revoir

Autofinancement plus conséquent qu'initialement programmé

acceptation car tous les fournisseurs sont touchés et si relance de marché, risque de non réponse

modification des devis

Des gels des pénalités contractuelles dans l'exécution des contrats de la commande publique sont-ils envisagés ?

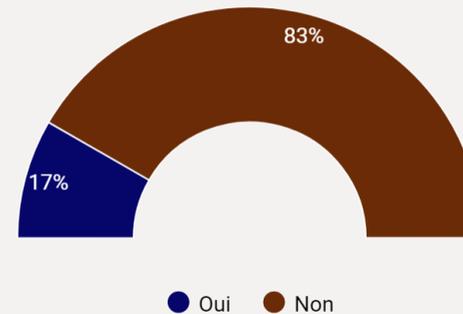

Si oui, pourquoi

Rechercher...

pénurie

exécution raison

entreprise retard

matériau lot

Retard dans l'exécution de certains lots, sans que la pénurie de matériaux n'en soit la raison

NE PAS PENALISER LES ENTREPRISES PLUS FORTEMENT

Comment allez-vous aller procéder pour appliquer les gels des pénalités contractuelles ?

Rechercher...

disposition

Conformément aux dispositions contractualisées

AU PRORATA



Nous remercions les maîtres d'ouvrage publics pour leur participation !
